

الخطة الزمنية لتنفيذ مسلك

الواجهات والبرمجة وقواعد البيانات وتجهيز النظام، من المرحلة 0 حتى الإطلاق، مبنية على الأقسام 20 إلى 22 من دراسة التحليل والتصميم v2.5. البداية الاثنين 5 تشرين الأول 2026.

نهاية المرحلة 0	الإطلاق التجريبي	إغلاق المرحلة 1	تشغيل النقل الترددي
تشرين الثاني ٢٠٢٨	تشرين الأول ٢٠٢٧	تشرين الثاني ٢٠٢٧	نيسان ٢٠٢٨
الجمعة ، ٢٧	الاثنين ، ٤	الجمعة ، ٢٦	الجمعة ، ٧


مهمة مخططة جزء منجز في المستودع معلّم رمضان والأعياد (تقريبي) اليوم



المصدر: دراسة التحليل والتصميم v2.5، الأقسام 20.4 و21 و22، ومحتوى المستودع حتى 3 تشرين الأول 2026. الإصدار 1.0.

الخطة الزمنية لتنفيذ مسلك


مهمة مخططة جزء منجز في المستودع معلّم رمضان والأعياد (تقريبي) اليوم

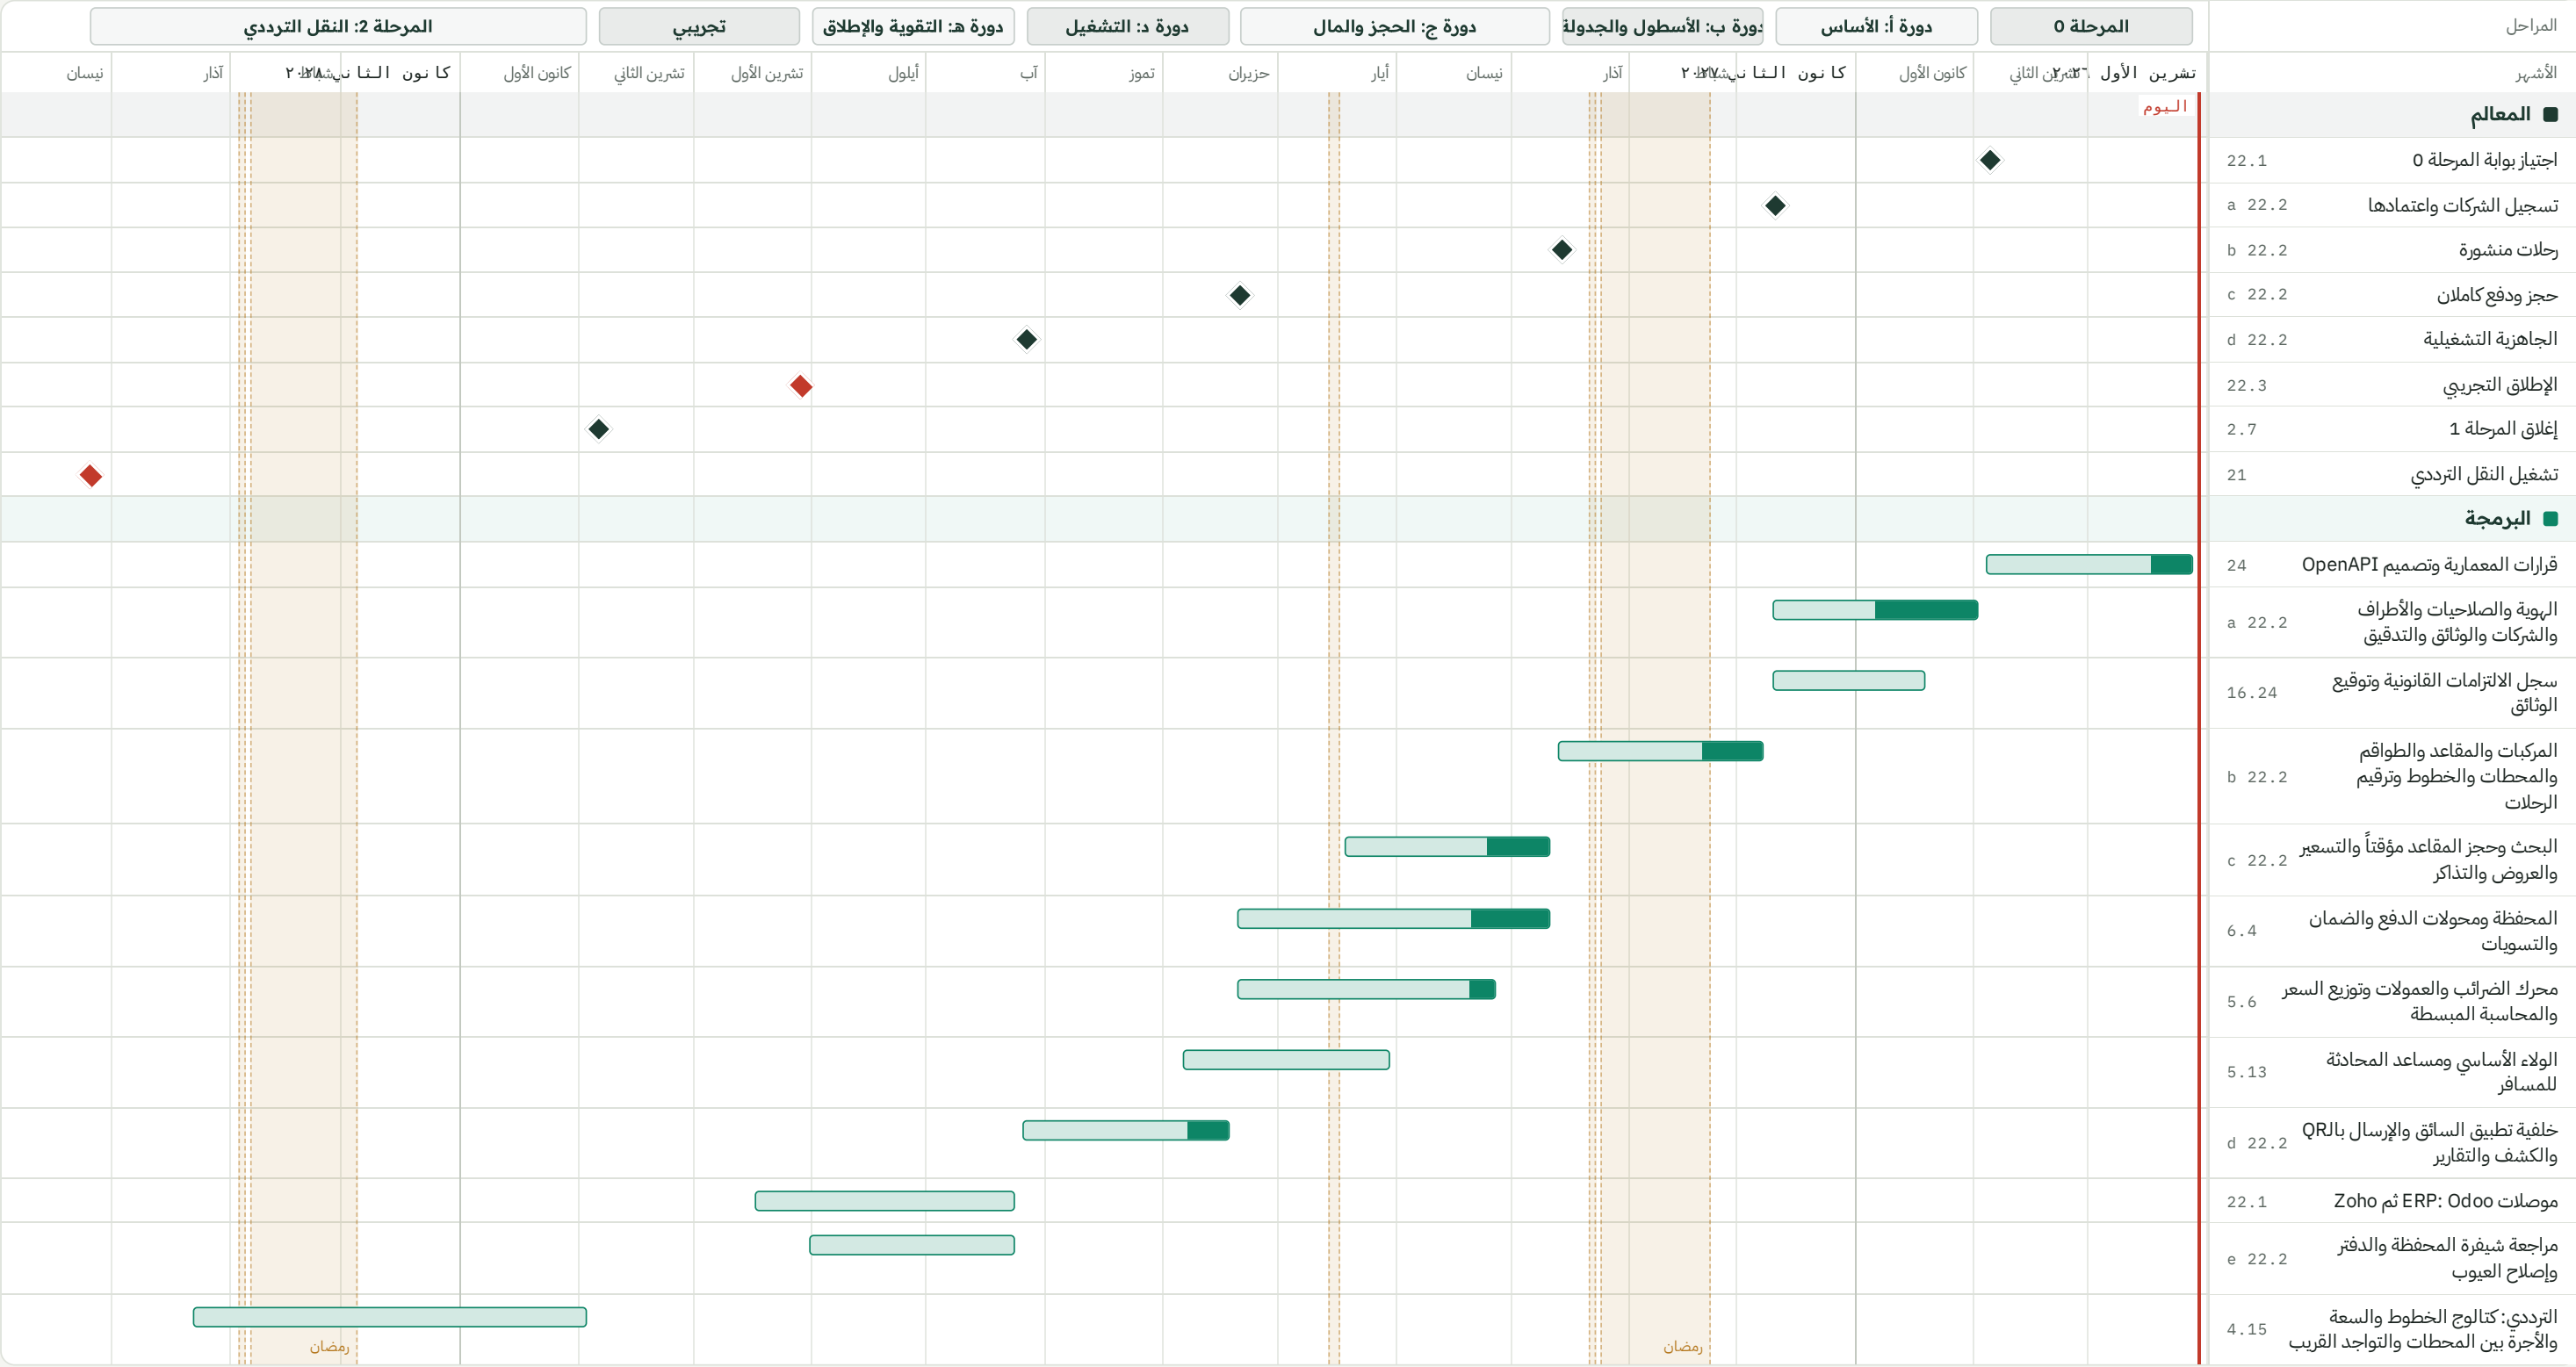

المصدر: دراسة التحليل والتصميم v2.5، الأقسام 20.4 و21 و22، ومحتوى المستودع حتى 3 تشرين الأول 2026. الإصدار 1.0.

الخطة الزمنية لتنفيذ مسلك


مهمة مخططة جزء منجز في المستودع معلم رمضان والأعياد (تقريبي) اليوم

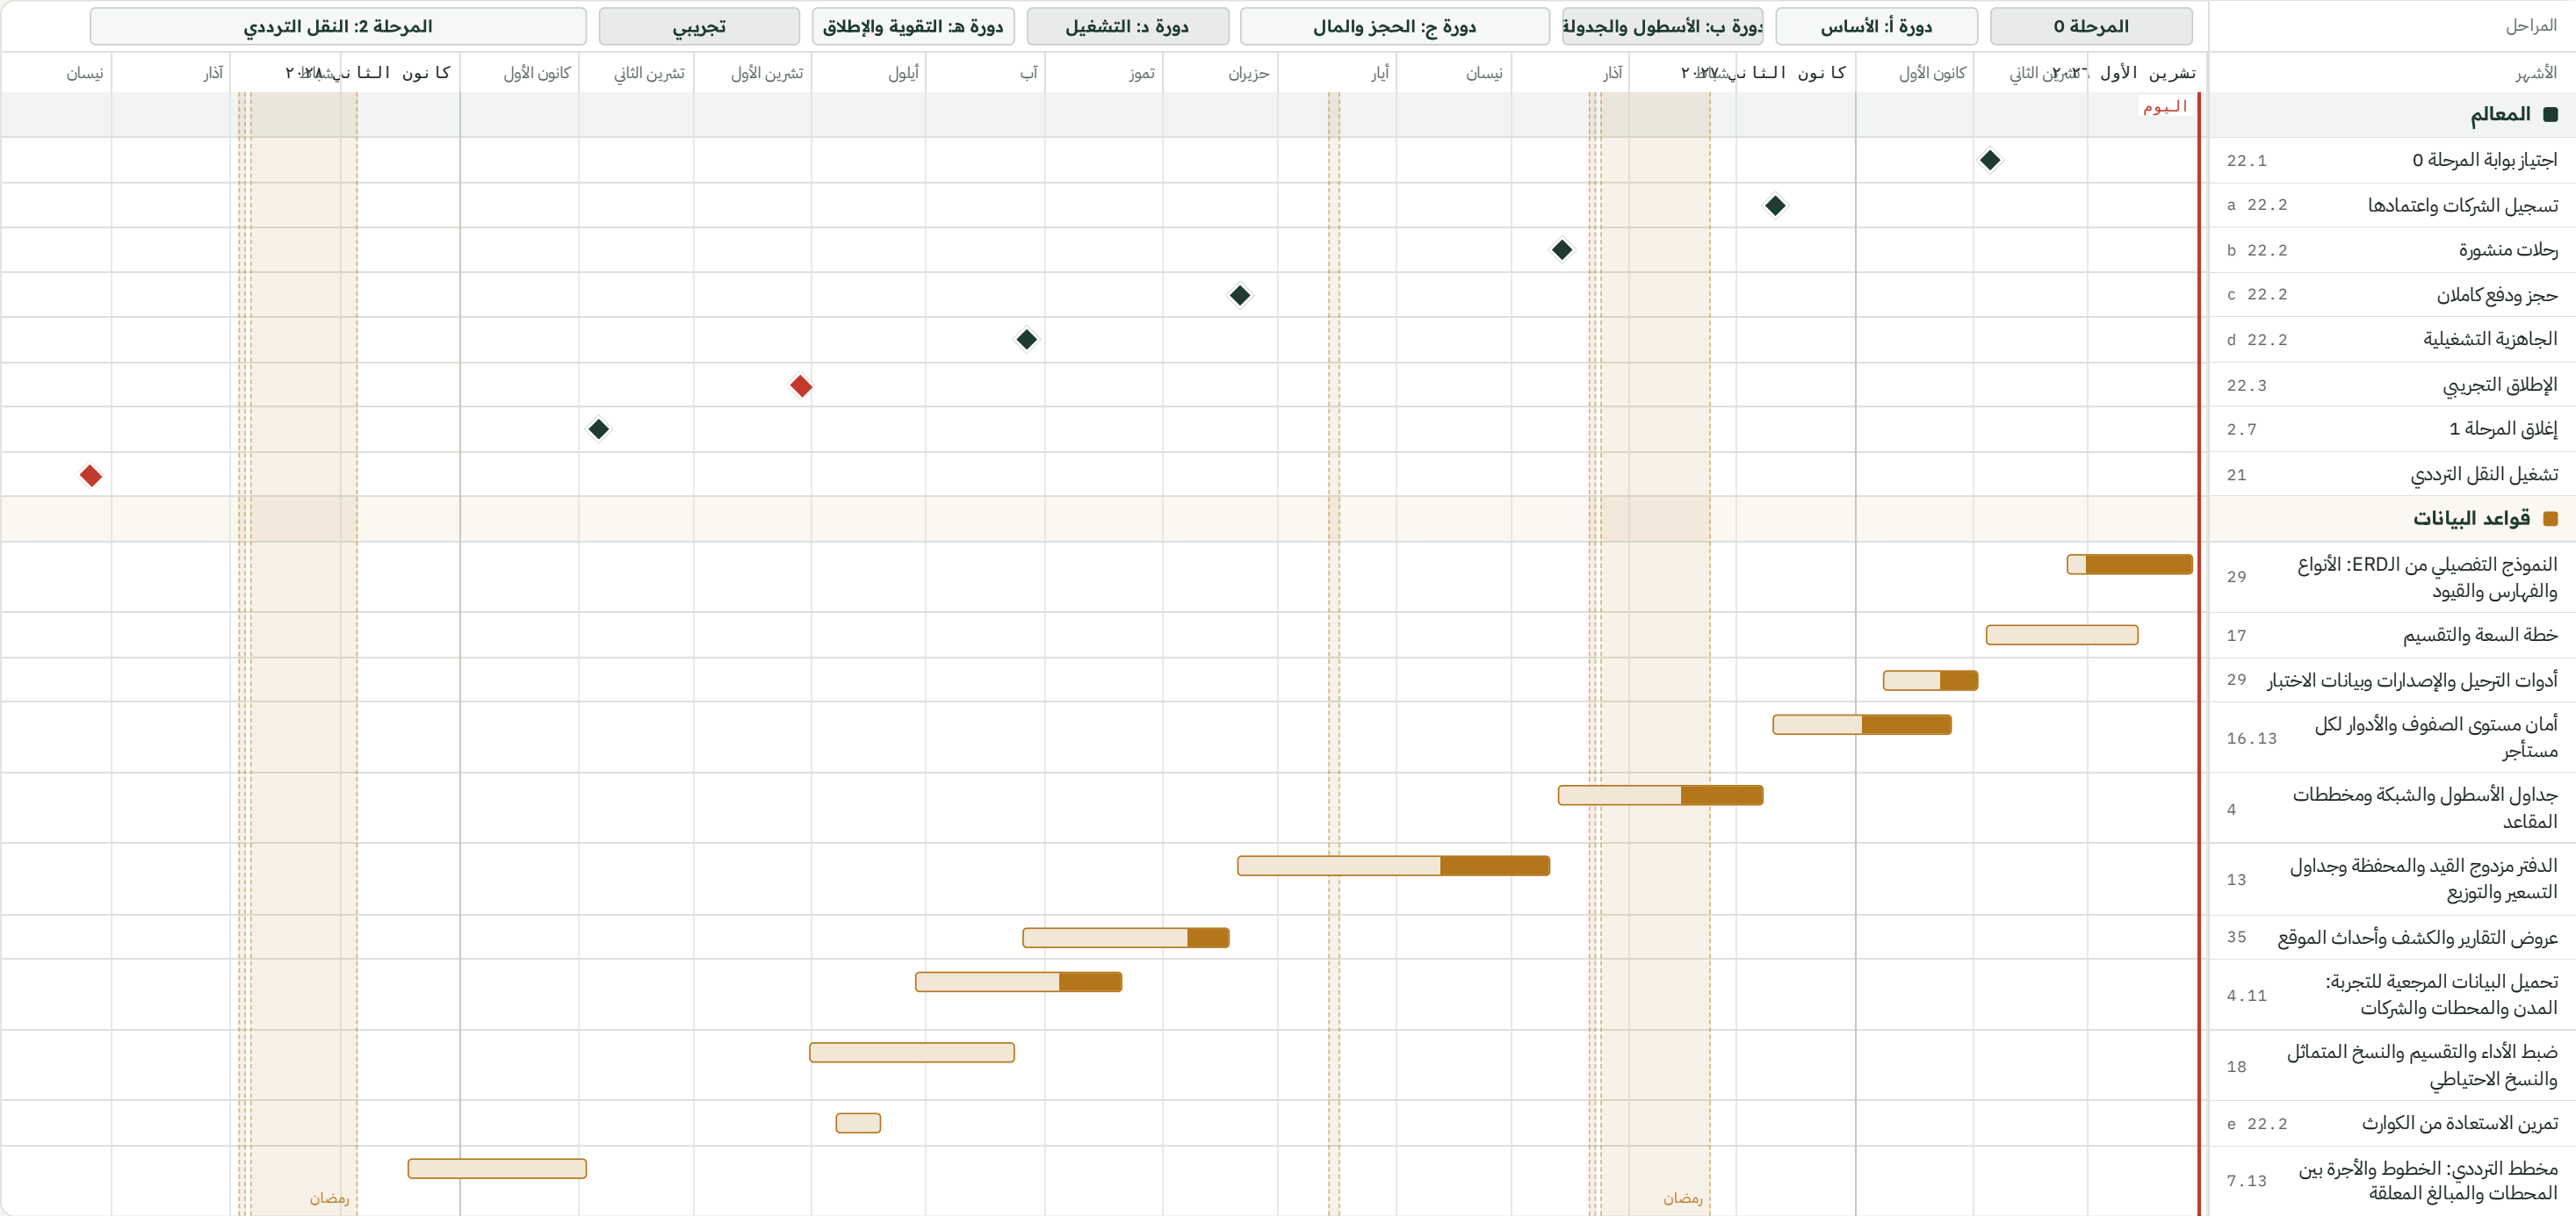

المصدر: دراسة التحليل والتصميم v2.5، الأقسام 20.4 و21 و22، ومحتوى المستودع حق 3 تشرين الأول 2026. الإصدار 1.0.

الخطة الزمنية لتنفيذ مسلك


مهمة مخططة جزء منجز في المستودع معلّم رمضان والأعياد (تقريبي) اليوم

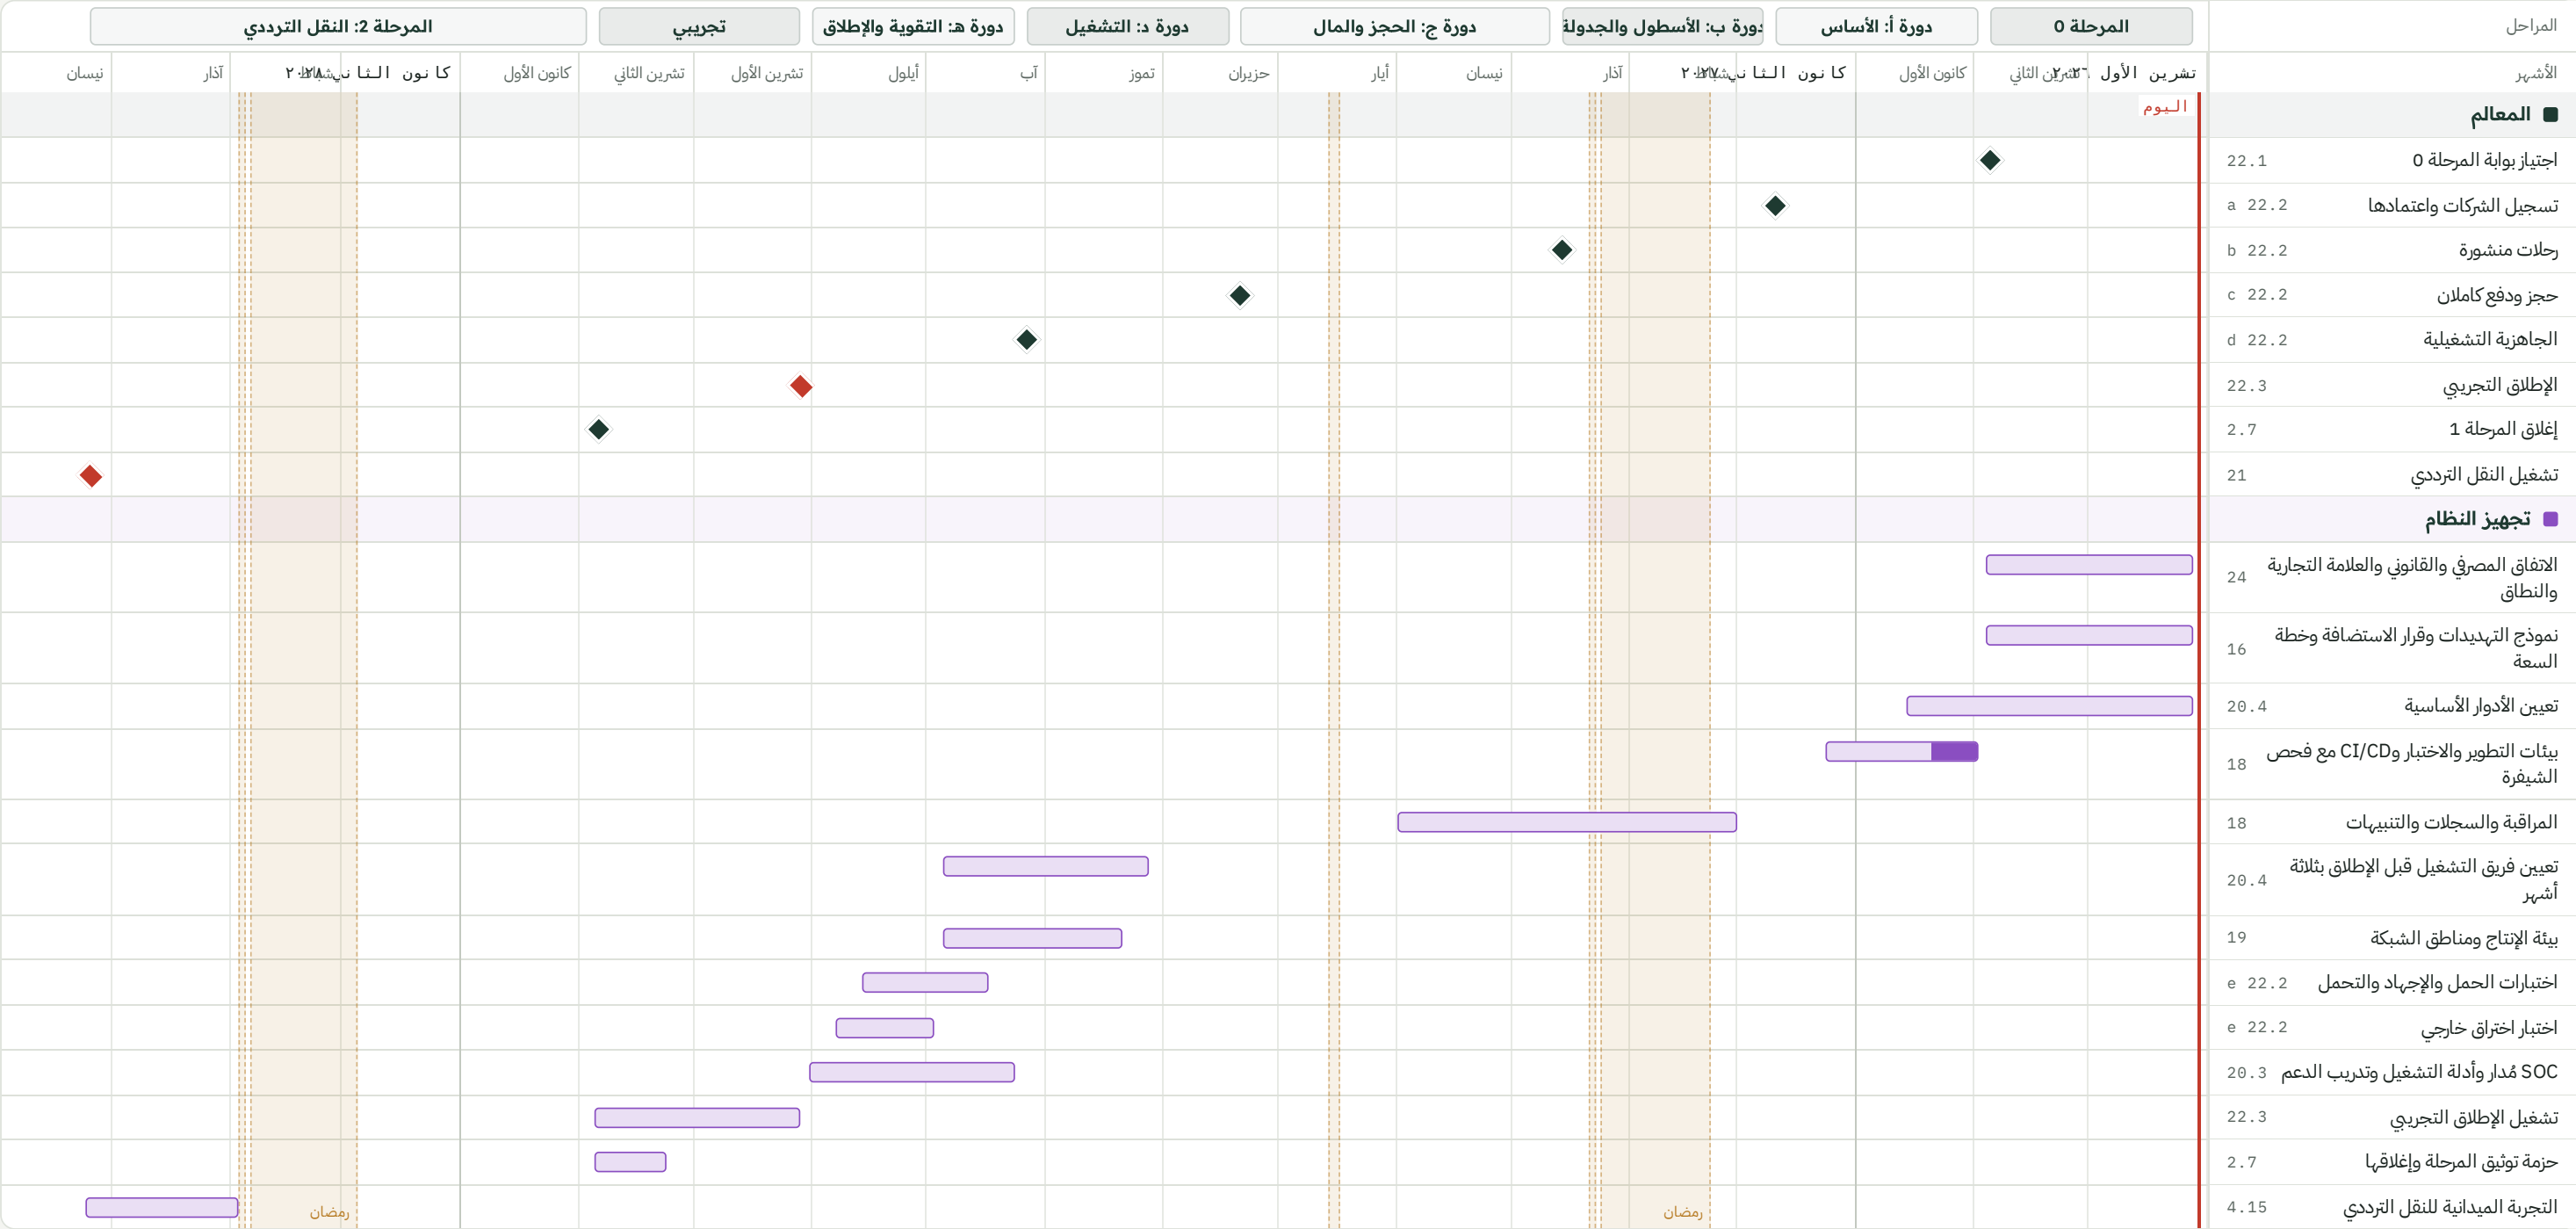

المصدر: دراسة التحليل والتصميم v2.5، الأقسام 20.4 و21 و22، ومحتوى المستودع حتى 3 تشرين الأول 2026. الإصدار 1.0.

الخطة الزمنية لتنفيذ مسلك

مهمة مخططة جزء منجز في المستودع معلّم اليوم

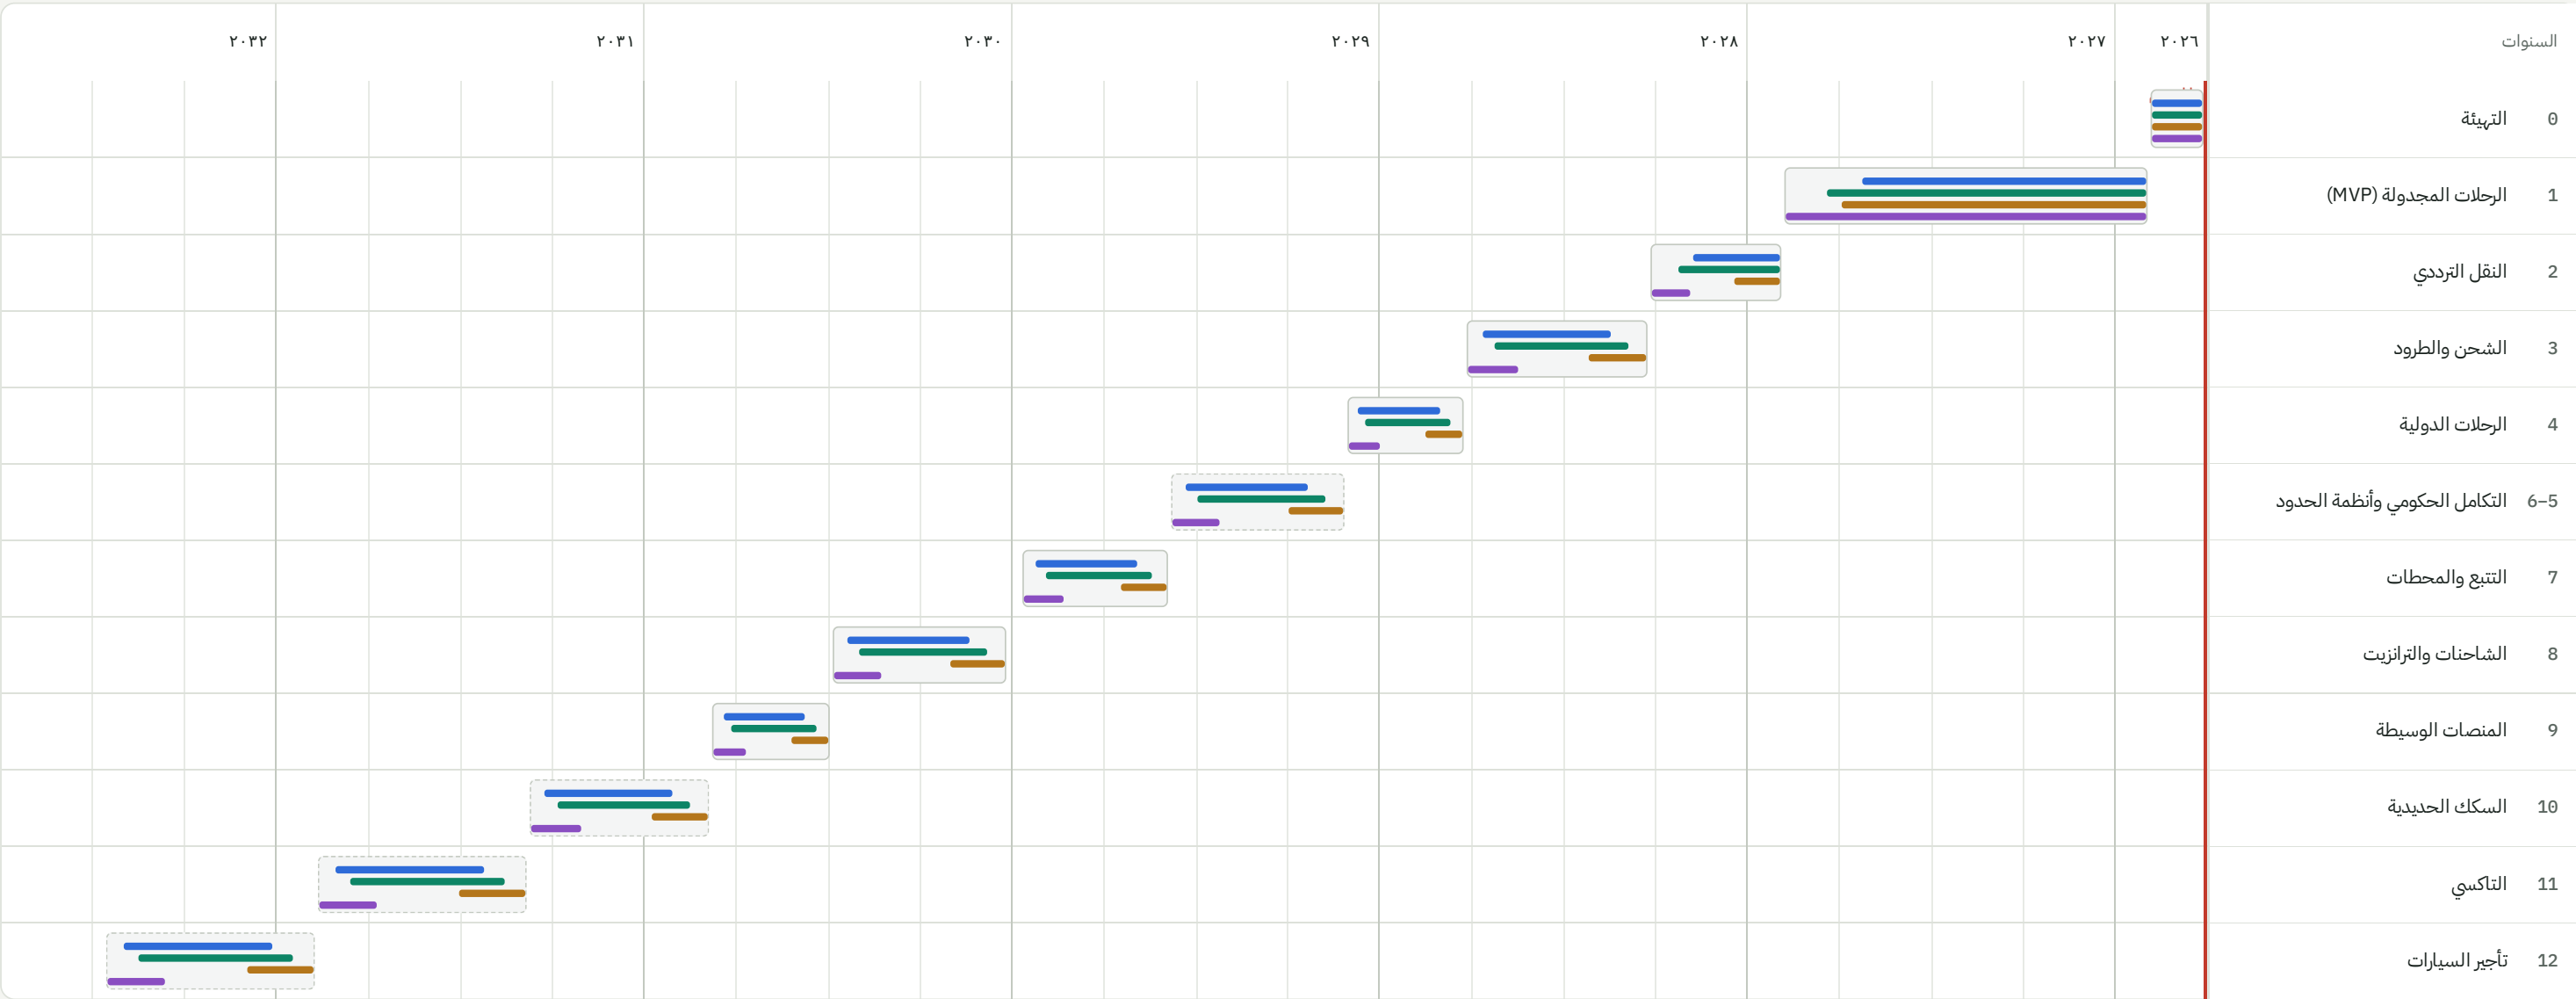

- ### ما هو منجز حالياً

 - مخطط قاعدة البيانات للمرحلة 1 بالإنكليزية فقط (16 ملف ترحيل حتى الإصدار 1.2.0) مع أمان مستوى الصفوف والبيانات المرجعية.
 - واجهة برمجية خلفية تغطي الحجز والمحفظة والناقل والسائق والإدارة والأمن والجهة النازمة والتحقق، مع اختبارات شاملة.
 - واجهة ويب عربية RTL وإنكليزية، وحزمة نشر (Caddy و Docker).
 - الجزء الممتلئ من كل شريط يمثل هذا المنجز. لم نقصّر المدد بسببه: يبقى المنجز بحاجة لمراجعة وتقوية، والفارق يصبح احتياطياً زمنياً.
- ### الفريق المقترح للمرحلة 1 (22.3)

 - مدير منتج، ومحلل أعمال، ومعماري حلول.
 - 4 إلى 5 مطوري خلفية، و2 واجهات ويب، و2 تطبيقات موبايل، ومصمم تجربة مستخدم.
 - 2 ضمان جودة، ومهندس DevOps، ومسؤول أمن بدوام جزئي، ومستشار قانوني ومالي.
 - قبل الإطلاق التجريبي بثلاثة أشهر: فريق SRE وأمن التطبيقات ومهندس أداء ودعم L1 وعقد مع مزود SOC مُدار (20.4).
- ### افتراضات الخطة

 - تبدأ المرحلة 0 يوم الاثنين 5 تشرين الأول 2026 بعد اعتماد الدراسة وحسم القرارات ذات الأولوية (القسم 24).
 - المدد مأخوذة من الجدول 22.1، وأخذنا الحد الأعلى حيث يوجد مدى: 8 أسابيع للمرحلة 0، و12 شهراً للمرحلة 1 بخمس دورات وإطلاق تجريبي.
 - تسير المراحل بالتتابع بفريق واحد. المرحلتان 5 و6 تعتمدان على جاهزية الجهات الحكومية، فقد تتغير تواريخهما.
 - مواعيد رمضان والأعياد تقريبية لأنها قمرية. الإطلاق التجريبي والتجربة الميدانية للنقل الترددي موضوعان خارجها.
 - تواريخ المراحل 10 إلى 12 استرشادية، وتبدأ بقرار من المالك بعد استقرار التتبع والاتفاق مع الجهة النازمة.

المصدر: دراسة التحليل والتصميم v2.5، الأقسام 20.4 و21 و22، ومحتوى المستودع حتى 3 تشرين الأول 2026. الإصدار 1.0.
