

الخطة الزمنية لتنفيذ مسلك

الواجهات والبرمجة وقواعد البيانات وتجهيز النظام، من المرحلة 0 حتى الإطلاق، مبنية على الأقسام 20 إلى 22 من دراسة التحليل والتصميم v2.5، البداية الاثنين 5 تشرين الأول 2026.


English العربية

نهاية المرحلة 0	الإطلاق التجريبي	إغلاق المرحلة 1	تشغيل النقل الترددي
تشرين الثاني ٢٠٢٨	تشرين الأول ٢٠٢٧	تشرين الثاني ٢٠٢٧	نيسان ٢٠٢٨
الجمعة، ٢٧	الاثنين، ٤	الجمعة، ٢٦	الجمعة، ٧

المراحل 0 إلى 2 بالتفصيل

خارطة المراحل كاملة

مهمة مخططة جزء منجز في المستودع معلّم رمضان والأعياد (تقريبي) | اليوم

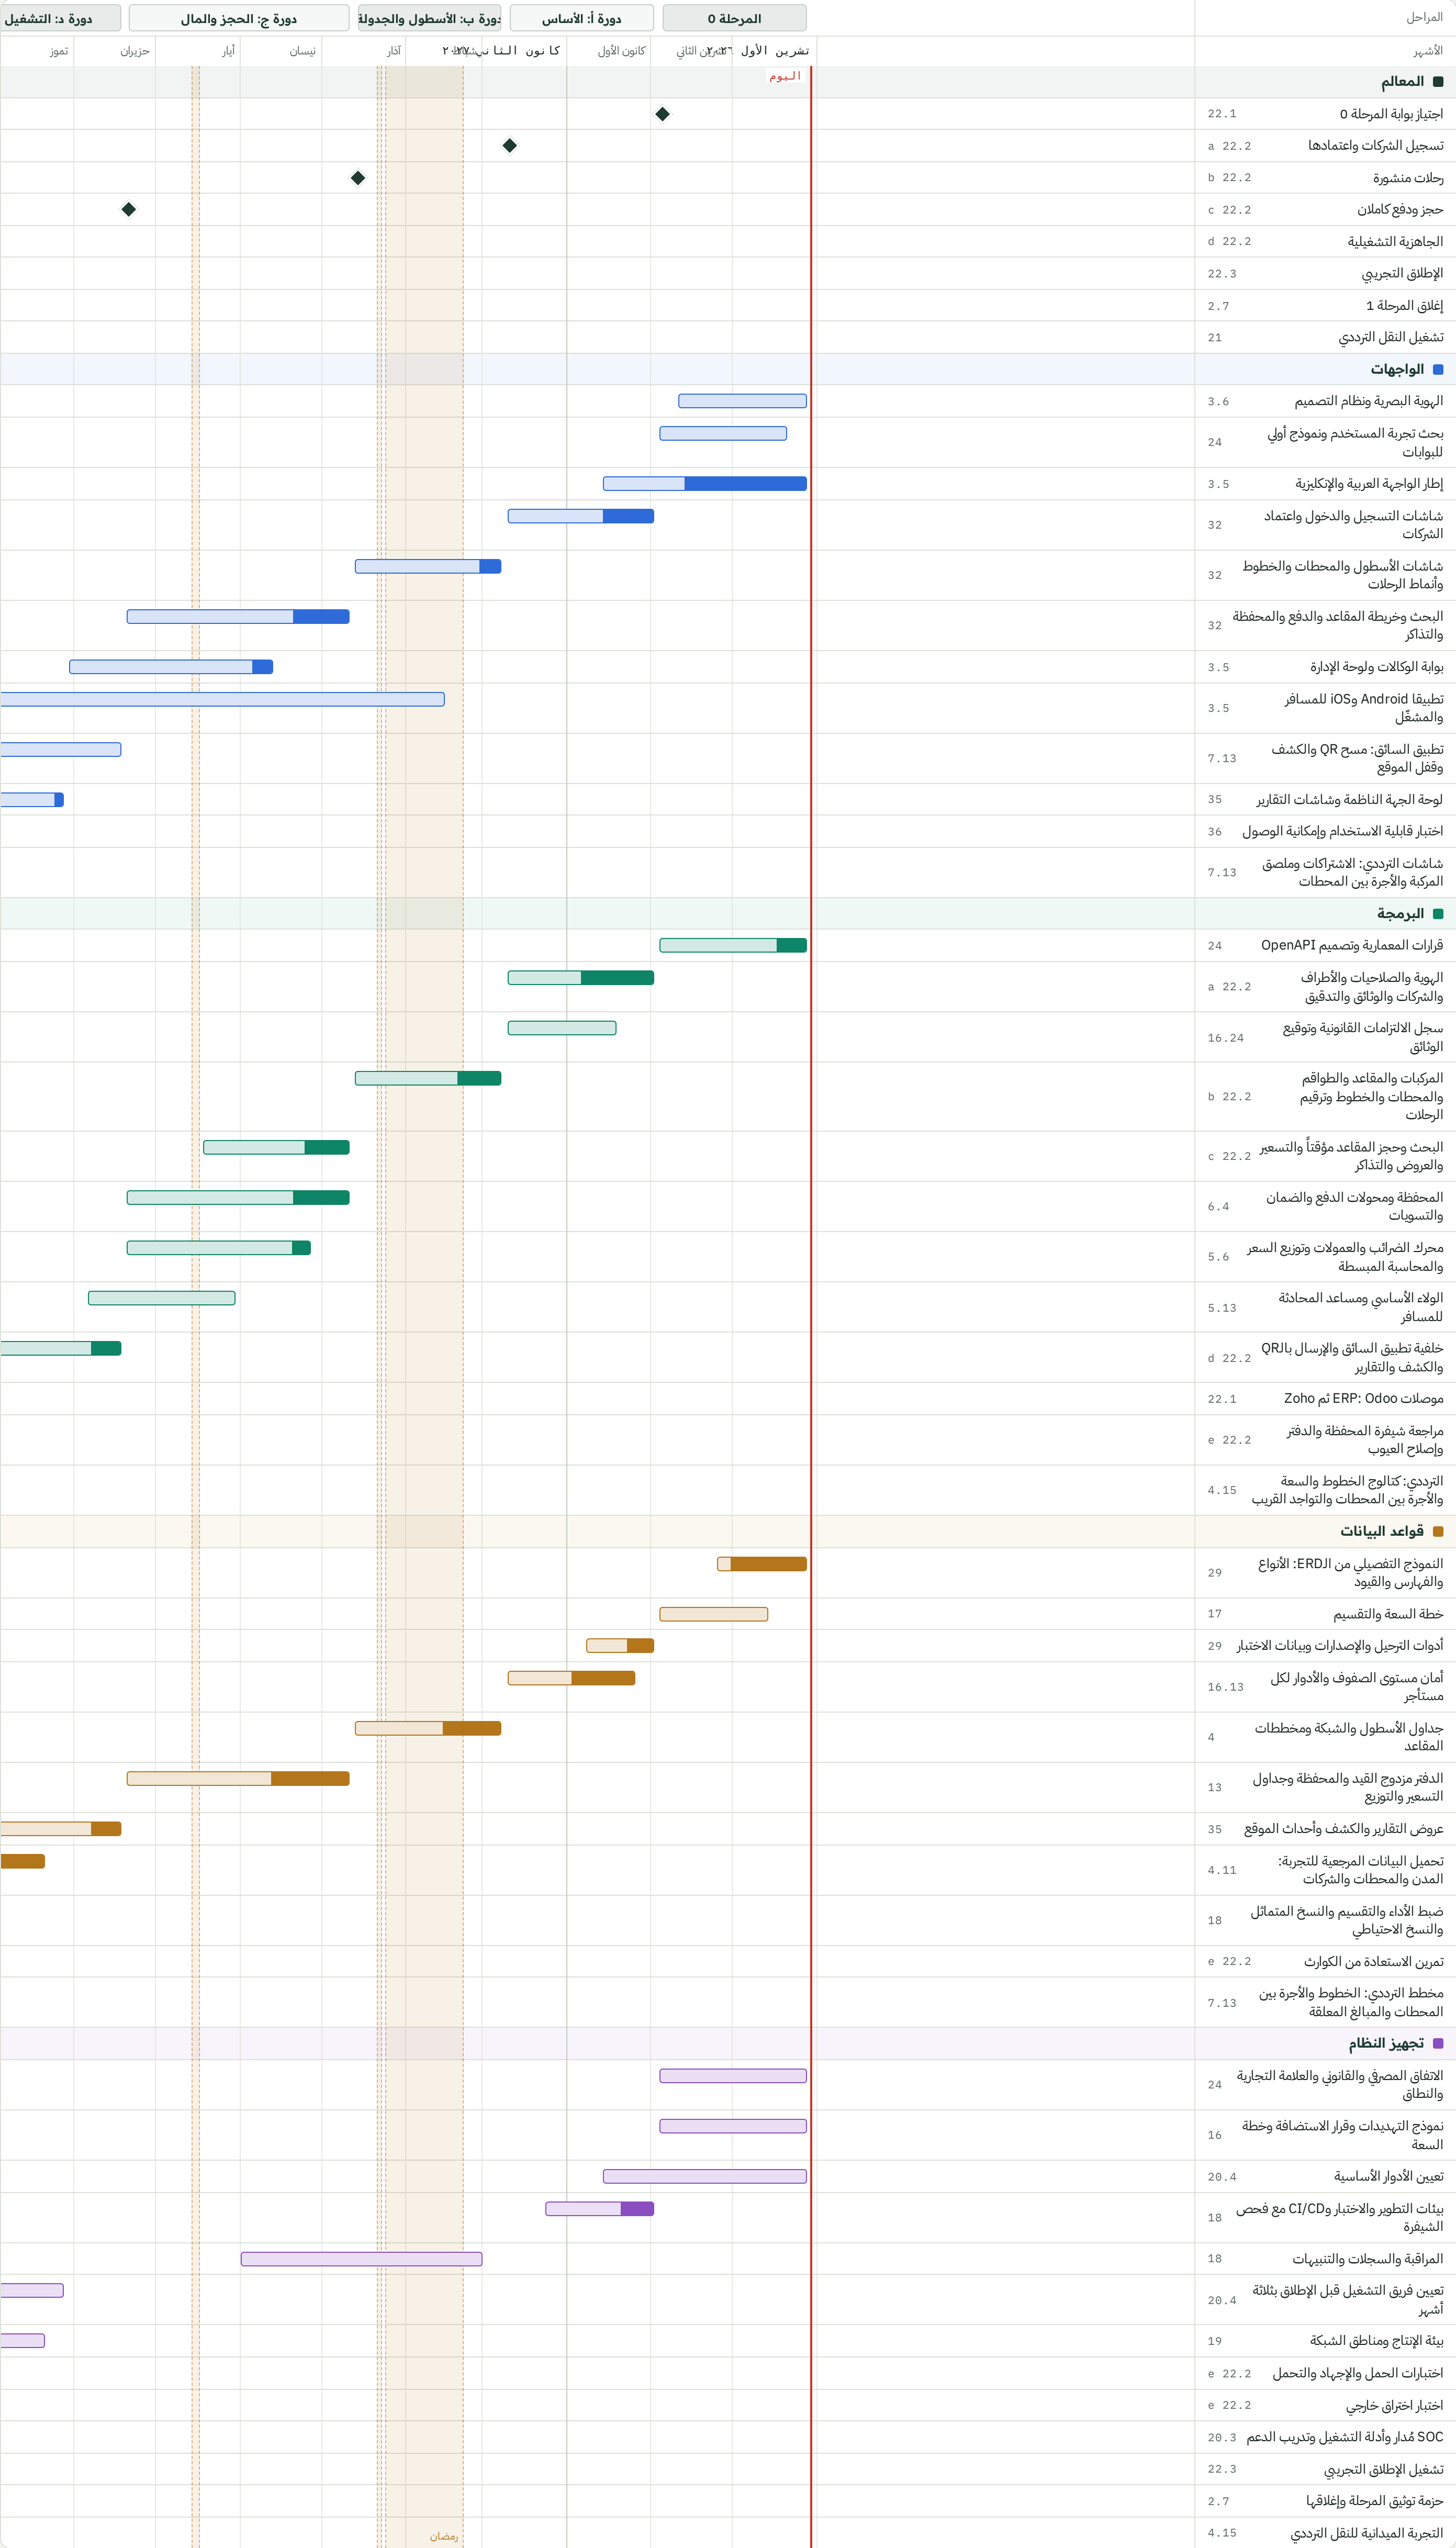

ما هو منجز حالياً

- مخطط قاعدة البيانات للمرحلة 1 بالإنكليزية فقط (16 ملف ترحيل حتى الإصدار 1.2.0) مع أمان مستوى الصفوف والبيانات المرجعية.
- واجهة برمجة خلفية تغطي الحجز والمحفظة والناقل والسائق والإدارة والأمن والجهة الناطمة والتحقق، مع اختيارات شاملة.
- واجهة ويب عربية RTL وإنكليزية، وحزمة نشر (Caddy وDocker).
- الجزء الممتلئ من كل شريط يمثل هذا المنجز. لم نقصر المدد بسببه: يبقى المنجز بحاجة لمراجعة وتقوية، والفارق يصبح احتياطياً زمنياً.

الفريق المقترح للمرحلة 1 (22.3)

- مدير منتج، ومحلل أعمال، ومعماري حلول.
- 4 إلى 5 مطوري خلفية، و2 واجهات ويب، و2 تطبيقات موبايل، ومصمم تجربة مستخدم.
- 2 ضمان جودة، ومهندس DevOps، ومسؤول أمن بدوام جزئي، ومستشار قانوني ومالي.
- قبل الإطلاق التجريبي بثلاثة أشهر: فريق SRE وأمن التطبيقات ومهندس أداء ودعم L1 وعقد مع مزود SOC مُدار (20.4).

افتراضات الخطة

- تبدأ المرحلة 0 يوم الاثنين 5 تشرين الأول 2026 بعد اعتماد الدراسة وحسم القرارات ذات الأولوية (القسم 24).
- المدد مأخوذة من الجدول 22.1، وأخذنا الحد الأعلى حيث يوجد مدى: 8 أسابيع للمرحلة 0، و12 أسبوعاً للمرحلة 1 بخمس دورات وإطلاق تجريبي.
- تسير المراحل بالتتابع بفرق واحد. المرحلتان 5 و6 تعتمدان على جاهزية الجهات الحكومية، فقد تتغير تواريخهما.
- مواعيد رمضان والأعياد تقريبية لأنها قمرية. الإطلاق التجريبي والتجربة الميدانية للنقل الترددي موضوعان خارجيا.
- تواريخ المراحل 10 إلى 12 استرشادية، وتبدأ بقرار من المالك بعد استقرار التتبع والاتفاق مع الجهة الناطمة.

الخطة الزمنية لتنفيذ مسلك

الواجهات والبرمجة وقواعد البيانات وتجهيز النظام، من المرحلة 0 حتى الإطلاق، مبنية على الأقسام 20 إلى 22 من دراسة التحليل والتصميم v2.5. البداية الاثنين 5 تشرين الأول 2026.

English العربية

نهاية المرحلة 0	الإطلاق التجريبي	إغلاق المرحلة 1	تشغيل النقل الترددي
تشرين الثاني ٢٠٢٦	تشرين الأول ٢٠٢٧	تشرين الثاني ٢٠٢٧	نيسان ٢٠٢٨
الجمعة ، ٢٧	الاثنين ، ٤	الجمعة ، ٢٦	الجمعة ، ٧

المراحل 0 إلى 2 بالتفصيل

خارطة المراحل كاملة

إظهار:


الواجهات

البرمجة

قواعد البيانات

تجهيز النظام

مهمة مخططة جزء منجز في المستودع معلم اليوم

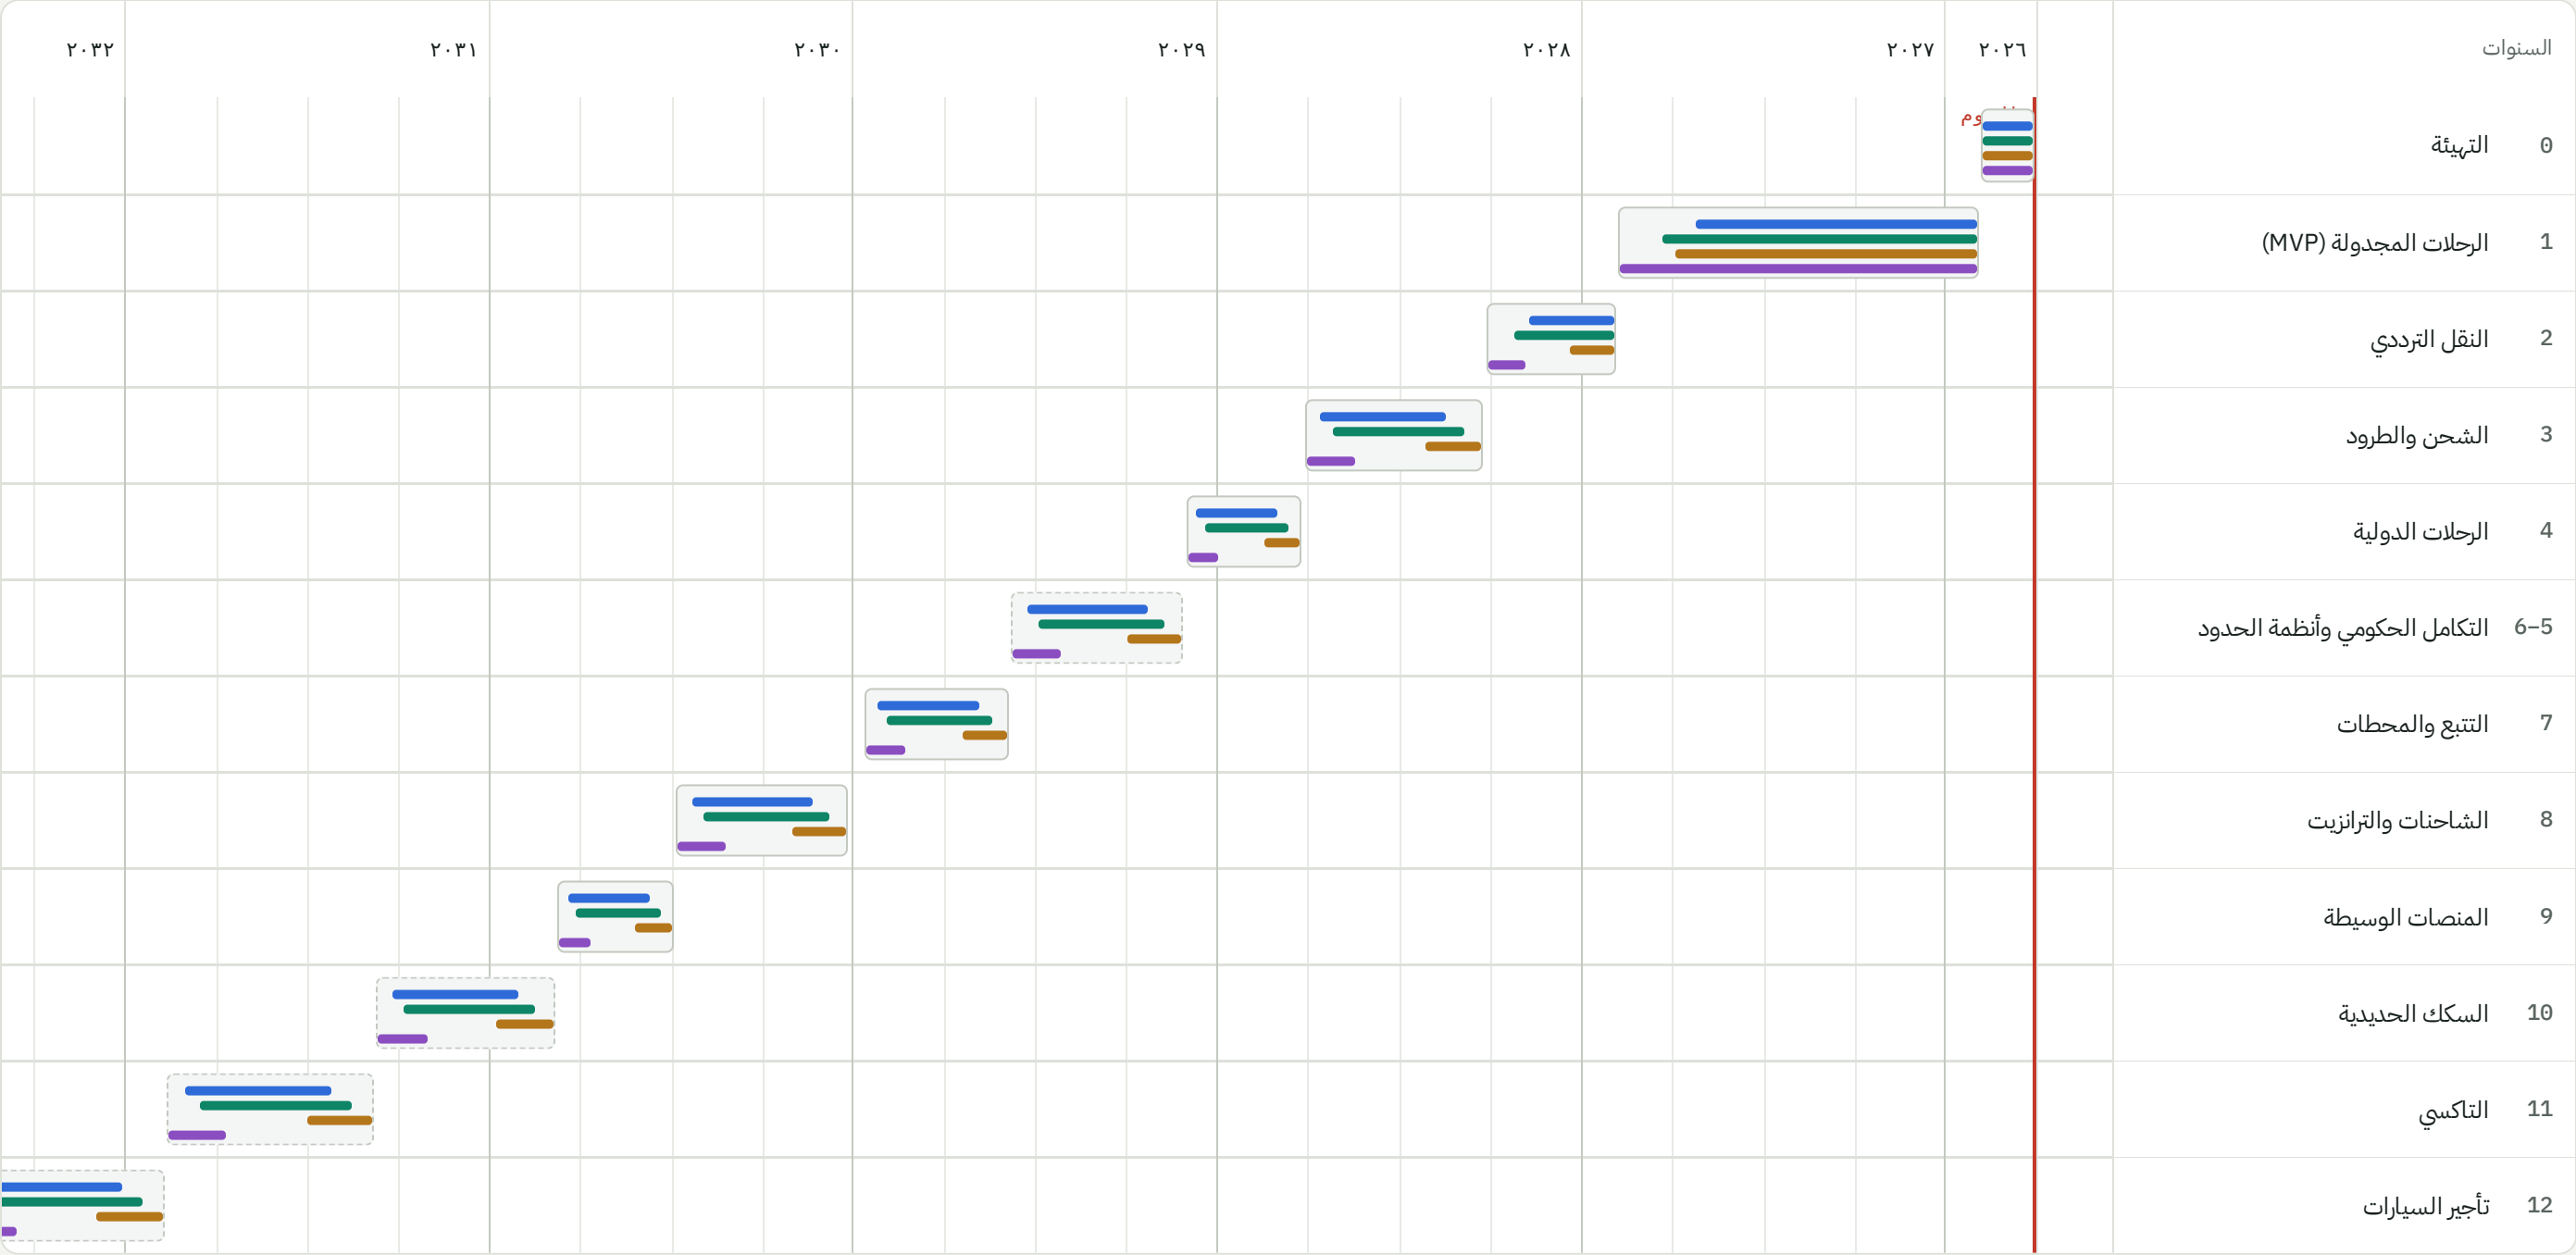

ما هو منجز حالياً

- مخطط قاعدة البيانات للمرحلة 1 بالإنكليزية فقط (16 ملف ترحيل حتى الإصدار 1.2.0) مع أمان مستوى الصفوف والبيانات المرجعية.
- واجهة برمجية خلفية تغطي الحجز والمحفظة والناقل والسائق والإدارة والأمن والجهة النازمة والتحقق، مع اختبارات شاملة.
- واجهة ويب عربية RTL وإنكليزية، وحزمة نشر (Caddy و Docker).
- الجزء الممتلئ من كل شريط يمثل هذا المنجز. لم نقصّر المدد بسببه: يبقى المنجز بحاجة لمراجعة وتقوية، والفارق يصبح احتياطياً زمنياً.

الفريق المقترح للمرحلة 1 (22.3)

- مدير منتج، ومحلل أعمال، ومعماري حلول.
- 4 إلى 5 مطوري خلفية، و2 واجهات ويب، و2 تطبيقات موبايل، ومصمم تجربة مستخدم.
- 2 ضمان جودة، ومهندس DevOps، ومسؤول أمن بدوام جزئي، ومستشار قانوني ومالي.
- قبل الإطلاق التجريبي بثلاثة أشهر: فريق SRE وأمن التطبيقات ومهندس أداء ودعم L1. وعقد مع مزود SOC مُدار (20.4).

افتراضات الخطة

- تبدأ المرحلة 0 يوم الاثنين 5 تشرين الأول 2026 بعد اعتماد الدراسة وحسم القرارات ذات الأولوية (القسم 24).
- المدد مأخوذة من الجدول 22.1، وأخذنا الحد الأعلى حيث يوجد مدى: 8 أسابيع للمرحلة 0، و12 شهراً للمرحلة 1 بخمس دورات وإطلاق تجريبي.
- تسير المراحل بالتتابع بفريق واحد. المرحلتان 5 و6 تعتمدان على جاهزية الجهات الحكومية، فقد تتغير تواريخهما.
- مواعيد رمضان والأعياد تقريبية لأنها قمرية. الإطلاق التجريبي والتجربة الميدانية للنقل الترددي موضوعان خارجها.
- تواريخ المراحل 10 إلى 12 استرشادية، وتبدأ بقرار من المالك بعد استقرار التتبع والاتفاق مع الجهة النازمة.
